


Рытов Александр Владимирович
начальник отдела международных программ и проектов управления
международных связей БГУ



«Разработка и менеджмент международных проектов в вузе»

Тема 3.
Разработка проектных заявок: логико-структурный подход.





Организация международной проектной деятельности в вузе

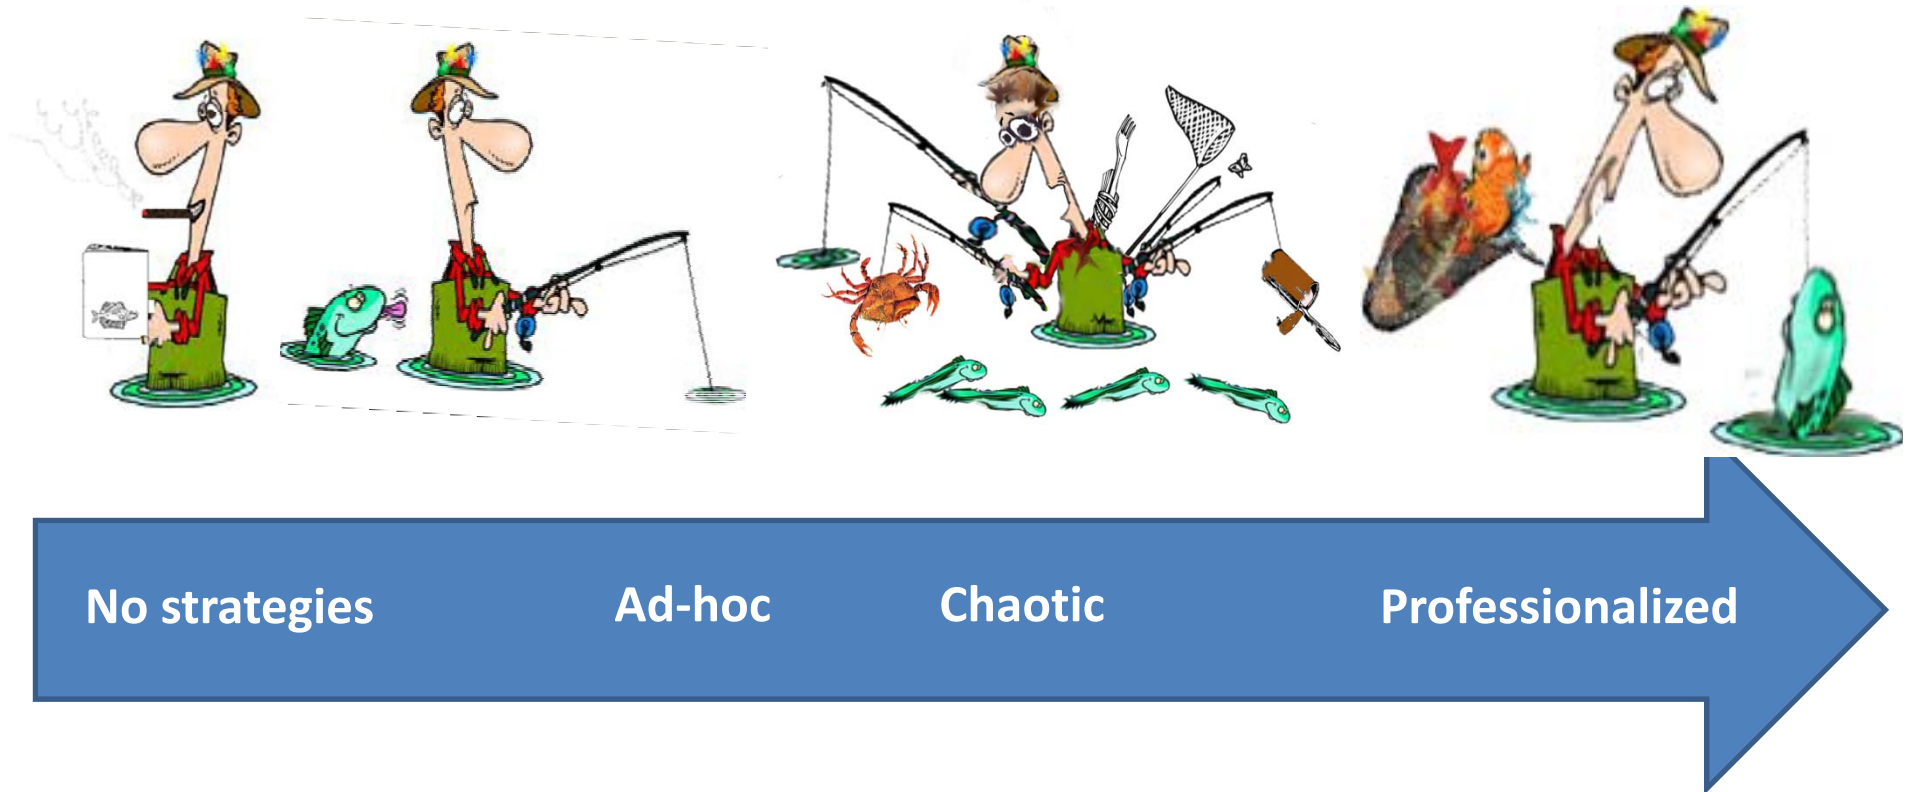





Организация международной проектной деятельности в вузе



Professionalized approach

- | | | |
|---------|---|--|
| ✓ ЧТО | ➔ | ✓ Анализ проблем и потребностей |
| ✓ КАК | ➔ | ✓ Формирование банка проектных идей |
| ✓ С КЕМ | ➔ | ✓ Формирование банка программ и инструментов, методической базы в помощь разработчикам |
| ✓ КТО | ➔ | ✓ Продвижение проектных идей и поиск партнеров |
| | ➔ | ✓ Формирование команд грантрайтеров, разработчиков и менеджеров проектов |







1. Инициирование проектов

Формулировка идеи / концепции проекта

Идея проекта должна соответствовать

- Интересам факультета / института
- Стратегии развития университета
- Национальным приоритетам развития той или иной сферы
- Тематике / приоритетам донора





1. Инициирование проектов

Анализ проблем и потребностей

Чего не хватает?

- опыта
- знаний
- умений / навыков

- эффективных форм организации деятельности

- современных учебно-методических материалов

- развитой инфраструктуры


Что необходимо


- семинары, стажировки, курсы повышения квалификации, учебно-ознакомительные визиты и др.

- реорганизация системы управления, создание новых «служб», совершенствование нормативной базы и др.

- разработка новых курсов, привлечение зарубежных преподавателей и т.д.

- приобретение оборудования





1. Инициирование проектов

Формулировка идеи / концепции проекта

Предложения по возможным международным проектам _____


(наименование структурного подразделения)


Рабочее название проекта (на русском и английском языках)	Цель и задачи проекта (на русском и английском языках)	Краткое обоснование (на русском и английском языках)	Краткий план (стратегия) деятельности по проекту (на русском и английском языках)	Контактные данные, ответственного за реализацию проекта (на русском и английском языках)

Электронный вариант направлять на e-mail: ippo@bsu.by пометкой «проектные идеи_факультет».

✓ Анализ проблем и потребностей

✓ Формирование команд грантрайтеров, разработчиков и менеджеров проектов







1. Инициирование проектов

Продвижение идеи проекта и поиск партнеров

- публикация банка проектных идей на сайте отдела
- рассылка зарубежным партнерам
- публикация на сайтах программ / фондов и агентств в рубриках «поиск партнеров»
- Every day promoting





1. Инициирование проектов

Продвижение идеи проекта и поиск партнеров

The screenshot displays the official website of the Belarusian State University (BSU). The header includes language selection (rus, бел, eng, de, ch, es, ar), social media links (B, f, t, You Tube, in, o, g+, R6), and a search bar. The main navigation bar lists: УНИВЕРСИТЕТ, АБИТУРИЕНТАМ, СТУДЕНТАМ, СОТРУДНИКАМ, ВЫПУСКНИКАМ, ПАРТНЁРАМ. A left sidebar contains a menu with 'На первую', 'Международное сотрудничество', and 'Международные проекты'. The 'Международные проекты' section is expanded, showing 'Международные программы и инструменты', 'Международные проекты БГУ', and 'БАНК ДАННЫХ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ'. The 'БАНК ДАННЫХ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ' section features a search interface with 'Тип проекта' and 'Область проекта' dropdowns, a 'Фильтр' button, and a list of project ideas. The list includes topics like seminars on Belarus, Lithuania, and Ukraine; sociological analysis of academic mobility; development of tourism in the Grodno region; and various international and regional academic and cultural projects. The footer contains a row of social media icons and a 100% zoom indicator.

рус бел eng de ch es ar

Б ф t You Tube in o g+ R6

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Одно окно | Телефоны и адреса | Фундаментальная библиотека
Электронная библиотека | Почтовый сервер | Электронные услуги

УНИВЕРСИТЕТ | АБИТУРИЕНТАМ | СТУДЕНТАМ | СОТРУДНИКАМ | ВЫПУСКНИКАМ | ПАРТНЁРАМ

→ На первую
→ Международное сотрудничество
→ Международные проекты
 Международные программы и инструменты
 Международные проекты БГУ
 • БАНК ДАННЫХ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ
 Законодательство Республики Беларусь по реализации международных проектов

Банк данных проектных идей


Тип проекта ...
Область проекта ...


Фильтр

- Цикл семинаров (на территории Беларуси, Литвы и Украины. Летняя школа «Формирование современного туристического продукта» (Крым, Украина)...
- Социологический анализ академической мобильности в Беларуси и других странах Восточного партнерства в условиях глобализации...
- Белорусско-литовское приграничье Гродненской области: социокультурные особенности и их использование в сфере рекреации и туризма...
- Международный научно-практический семинар "Развитие туризма и охрана историко-культурного наследия на Пограничье" (Польша-Беларусь, Белосток)...
- Разработка тренинг-сети для развития образования по энергосбережению...
- Проект по созданию специальных направлений в деятельности учебной лаборатории «Юридическая клиника» юридического факультета Белорусского государственного университета и факультета права Вильнюсского университета ...
- Совместная подготовка аспирантов в области квантовой оптики, квантовой информации и метаматериалов "Quantum-BSU"...
- Разработка совместной программы для магистров и аспирантов по «Физике конденсированного состояния» "XFEL-BSU"...
- Процессы социальной и экономической модернизации Балтийского региона в составе Российской империи (1710 - 1914 гг.) ...
- Практический английский для работников международного отдела вуза...
- Разработка курса лекций для магистрантов "Основы межкультурной коммуникации"...
- Разработка курсов «Управление документами» и «Защита персональных данных» (на иностранном языке)...
- Национальные и территориальные проблемы в странах Карпато-Дунайского региона – история и современное состояние...
- Цикл академических обменов и визитов преподавателей в области источниковедения, архивоведения, документоведения...
- Разработка курсов «Информационное право» и «Архивное право»...
- Виртуальная реконструкция документально наследия Пичеты, Карского, Довнар-Запольского...
- Публичные и частные аспекты Европейского экономического права...
- Развитие и укрепление международного межузовского партнерства....
- Подготовка совместного (Беларусь, Украина, Россия, Польша, Франция, Германия) учебника по архивоведению...
- Школа-семинар по астрофизике для молодых ученых "ICRANet -BSU Astrophysics"...
- Совместная программа магистерской подготовки по управлению документами и архивному делу...
- Документационное обеспечение академической мобильности....

100%

Банк проектных идей БГУ на сайте университета





1. Инициирование проектов


Продвижение идеи проекта и поиск партнеров

Промо-буклет для
рассылки и передачи
зарубежным



Belarusian State University

**Let's make
projects
together!**



1. Инициирование проектов

Продвижение идеи проекта и поиск партнеров

Офис программы ERASMUS+ в Республике Беларусь

<http://erasmus-plus.belarus.unibel.by>

Размещение проектных
идей на сайтах
программ и фондов

Координационное бюро Программы ТАСИС в Республике Беларусь

<http://old.cu4eu.by/ru/>

Программа «Регион Балтийского моря»

<http://eu.baltic.net/>

Отделение Совместного Технического Секретариата программы ТГС


«Латвия-Литва-Беларусь» <http://www.enpi-cbc.eu/go.php/rus/KONTAKTY/196/2/43>


Отделение Совместного Технического Секретариата программы ТГС

«Латвия-Литва-Беларусь» <http://www.enpi-cbc.eu/go.php/rus/KONTAKTY/196/2/43>

**Он-лайн портал для потенциальных заявителей на программы ЕС
PADOR -**


https://ec.europa.eu/europeaid/work/online-services/pador/index_en.htm_en







Организация международной проектной деятельности в вузе

Сайт УМС, раздел “Международные проекты” www.ums.bsu.by

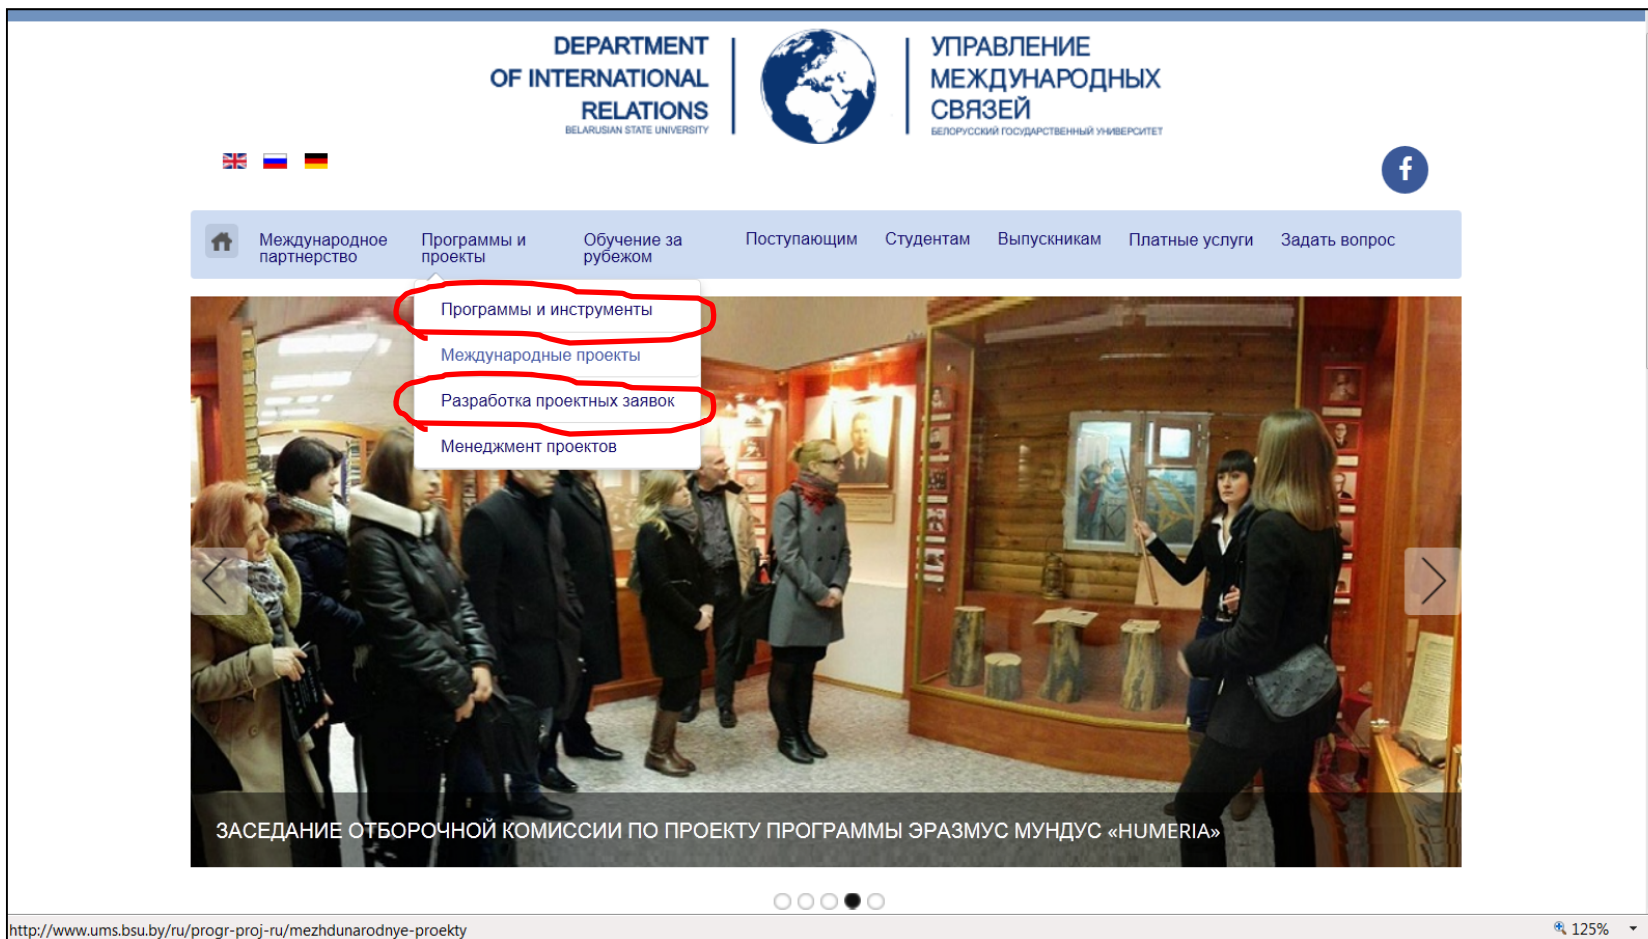

Рытов А.В. Разработка и менеджмент международных проектов в вузе. 2015







Структура проектной заявки и методы проектирования деятельности

- ✓ Обосновательная часть (цели, задачи в связи с анализом потребностей, актуальность, и т.д.)
- ✓ План действий (краткое и развернутое описание мероприятий, места и сроков их реализации и т.д.)
- ✓ Ресурсы (подробный расчет затрат на реализацию проекта, сводные бюджеты, т.е. в разрезе партнеров, мероприятий и статей бюджета, общий бюджет)
- ✓ Проектная команда (описание участников проекта с точки зрения из соответствия целям проекта)


Логико-
структурная
матрица





Структура проектной заявки и методы проектирования деятельности


Логико-структурный подход

	Описание программы (логика проекта)	Измеримые показатели достижений (индикаторы)	Источники и методы для подтверждения достижений	Предположения и риски
	1	2	3	4
	Общая цель	Показатели достижения общих целей	Источники и методы подтверждения достижений	
	Задачи проекта	Показатели достижения задач проекта	Источники и методы подтверждения достижений	Допущения, влияющие на связь между конкретными и общими целями
	Результаты	Показатели достижения результатов	Источники и методы подтверждения достижений	Допущения, влияющие на связь между результатами и конкретными задачами
	Действия (Мероприятия)	Требующиеся человеческие и физические ресурсы	Стоимость человеческих и физических ресурсов	Допущения, влияющие на связь между действиями и результатами

мониторинг и оценка



Рытов А.В. Инициирование ме
проектных заявок, Минск, БГУ, 21 мая 2015 г.





Практическая работа: составление ЛСМ для проекта «Ноев ковчег»

From: БОГ[mailto:БОГ@НЕБЕСА.АЛИЛУЯ]

Sent: Friday, June 26, 2015 3:54 PM

To: Ной

Сс: Адам, Ева

Subject: проект «Ноев ковчег»

Дорогой Ной,

Спешу огорчить тебя – грядет великий потоп! Через 6 месяцев НЕБЕСА разверзнутся и дожди будут идти 40 дней. Суша исчезнет. ☹


На тебя возлагается великая миссия - спасти все живое на Земле, чтобы жизнь длилась и далее на многие тысячелетия!

Возьми столько сколько тебе потребуется ресурсов, построй ковчег, помести на него по паре каждого вида, и плыви в море. Пусть ваша ВЕРА ого будет вам в помощь.

Успехов,

твой БОГ


Рытов А.В. Инициирование международных проектов и разработка проектных заявок, Минск, БГУ, 21 мая 2015 г.






Практическая работа: составление ЛСМ для проекта «Ноев ковчег»

• Обеспечить долгосрочное выживание человека и животных на земле.	• 1.1 Все виды приносят потомство в течение следующего цикла размножения и продолжают размножаться. • 1.2 Через 100 лет общее # животных > # до потоп.	• 1.1 Уровень рождаемости. • 1.2 Учет численности через 100 лет.	
• Пережить потоп.	• 1. Ковчег достигает суши, 100% животных и людей, которые были на борту, живы, здоровы и способны к размножению.	• 1.1 Проверить список пассажиров. • 1.2 Провести проверку состояния здоровья.	• 1. Дожди прекратятся через 40 дней; уровень воды снизится через 20 дней. • 2. Сильный ветер не повредит ковчег. • 3. Достаточное количество запасов и продовольствия. • 4. Все системы на ковчеге работают исправно.



Практическая работа: составление ЛСМ для проекта «Ноев ковчег»

1. Ковчег построен. 2. На ковчег погружены все необходимые запасы. 3. Люди и животные собраны и погружены.	1. К 20 неделе построен пригодный для спуска на воду ковчег в соответствии с проектом. Ковчег способен вместить по одной паре всех животных на земле. 2. На ковчег погружены все необходимые запасы и оборудование. Запасы включают фунтов продовольствия на 1 животное в день, медицинское и сервисное оборудование, семена и т.д. 3. К 22 неделе на ковчег погружено как минимум по одной здоровой и способной к размножению паре каждого вида.	1. Осмотр и тестовый спуск на воду. 2. Сверка со списком необходимых запасов и оборудования. 3. Проверка состояния здоровья для всех животных по списку.	1. Дожди начнутся не ранее, чем через 6 месяцев. 2. Благоприятная погода для строительства. 3. Все животные на борту внесены в список.
1. Ковчег построен. 1.1 Спроектировать ковчег. 1.2 Нанять рабочих. 1.3 Заготовить древесину. 1.4 Построить ковчег. 2. Ковчег загружен. 2.1 Определить необходимые запасы. 2.2 Собрать/ погрузить запасы. 3. Животные погружены. 3.1 Определить типы животных. 3.2 Построить загоны. 3.3 Поймать животных. 3.4 Проверить состояние здоровья/ пол.	- Проектная документация, Пилы, древесина, гвозди, доски. - Архитектор, 2 недели, 25 сильных мужчин, 300 человеко-дней. - Продовольствие, медикаменты, оборудование. 12 человеко-дней. - Гвозди, пилы, доски, наживка и приманки, ветеринарные наборы. - Зоолог, 10 человеко-дней, Звероловы, 20 дней, 30 человеко-дней.		1. Наличие достаточного количества рабочей силы и древесины. 2. Люди и животные сотрудничают. Все будет готово к погрузке до начала дождей. 3. Все необходимые разрешения могут быть быстро получены. 4. Ной готов помочь. - Все инструкции подлинны.



Спасибо за 3 день работы!

Александр Владимирович Рытов

Начальник отдела международных программ и проектов

Управление международных связей

Белорусский государственный университет

Ул.Ленинградская 20, кабинет 409

Тел.: +375-17-2095447

E-mail: rytov@bsu.by

Web: <http://www.bsu.by/ru/main.aspx?guid=101791>

